


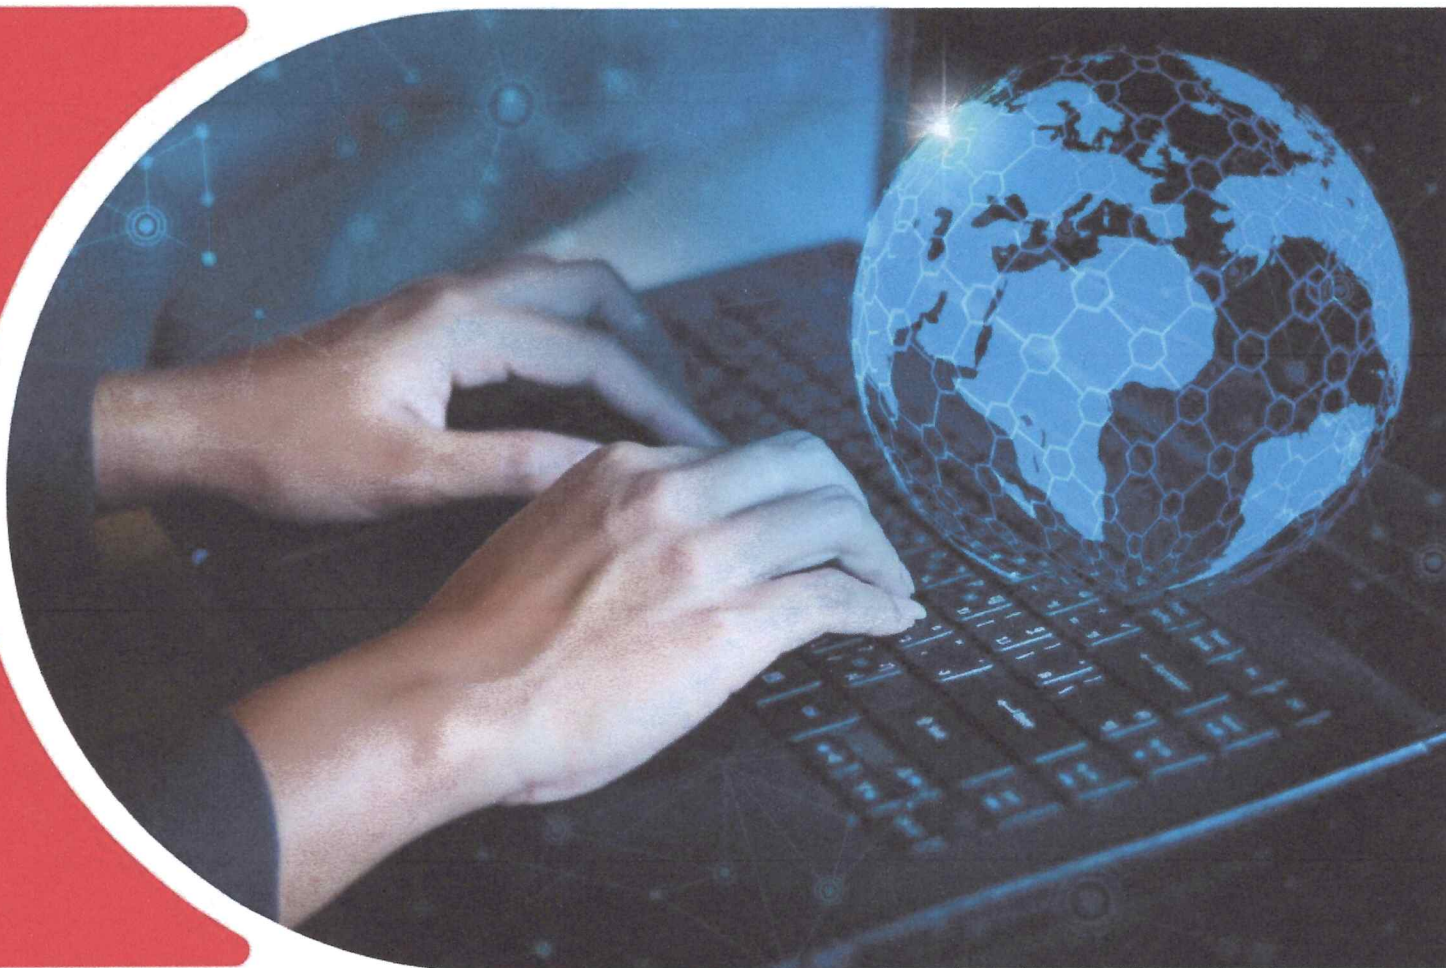

INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN REPUBLICA
DOMINICANA
(DR-L1150)

gcl

Abril – Junio 2025

Introducción

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

Durante el segundo trimestre del 2025 concluimos el modelo funcional del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (PPORMD), uno de los principales procesos iniciados en el año anterior. Adicionalmente, se continuó la elaboración de los términos de referencia para los procesos de adquisiciones principales del proyecto, los cuales iniciarán ejecución en el 2026, a partir del agrupamiento que realizamos en el último trimestre del 2024. Vale destacar, la asignación de una cooperación técnica no-reembolsable por parte del BID para la definición de los aspectos de interoperabilidad que serán requeridos contratar con la fábrica de software del Subcomponente 1.1, estipulada para 2026 y 2027.

En el Subcomponente 1.4 se logró ejecutar el levantamiento, diagnóstico y sugerencias del marco legal del Registro de Beneficiarios Finales y la Ley de Protección de Datos Personales. Las mismas serán presentadas al CONCLAFIT en el segundo semestre del año, para fines de decisión al respecto.

Adicionalmente, en este período, nos fue solicitado la recontractación del equipo de desarrollo del modelo funcional del PPORMD mencionado anteriormente. Aunque logramos iniciar los aprestos para esta recontractación, quedó de manifiesto la necesidad de dimensionar y estructurar de manera definitiva la iniciativa del desarrollo del SIGEF 2.0, para lo cual se iniciaron conversaciones integradas entre la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Dirección de Gestión del SIAFE (DIGES), el Ministerio de Hacienda (MH) y el BID. Este último ha manifestado la disponibilidad de fondos de Cooperación Técnica Española para realizar el dimensionamiento.

Se está dando curso a este camino que ayudará a definir, dimensionar y trazar los recursos a requerir para llevar a cabo este proyecto que en sí mismo impactaría de manera favorable la gestión del sistema financiero del país.

Continuamos las gestiones de los consultores y adquisiciones contratadas para cada producto de los componentes I y III, donde se podrá visualizar más abajo el avance físico alcanzado a la fecha.

Avance físico por componente

A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del cuarto Abril – Junio 2025:

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana					
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos		20-abr-22	29-ago-28	33%
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas		11-dic-23	27-ago-27	44%
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGES	11-dic-23	5-nov-26	52%
1.1.2	Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados		30-ene-24	27-ago-27	21%
1.1.3	Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		10-abr-25	10-mar-27	0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas		11-mar-24	21-abr-28	25%
1.2.1	Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información actual de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas temprana	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	11-mar-24	21-abr-28	24%
1.2.2	Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		15-mar-24	12-oct-26	28%
1.2.3	Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		15-mar-24	2-feb-27	45%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas		23-nov-23	20-dic-27	29%
1.3.1	Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	23-nov-23	20-dic-27	29%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera		20-abr-22	29-ago-28	35%
1.4.1	Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	20-abr-22	29-ago-28	35%
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado		20-abr-22	28-ene-28	32%
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción		20-abr-22	3-nov-27	36%
3.1.1	Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	11-mar-24	3-nov-27	31%
3.1.2	Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés		20-abr-22	6-abr-26	35%
3.1.3	Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-feb-24	29-dic-26	55%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa		20-abr-22	3-ene-28	39%
3.2.1	Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad.	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	20-abr-22	3-ene-28	39%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información		1-may-24	28-ene-28	28%
3.3.1	Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	28-ene-28	28%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad		24-oct-24	18-ene-28	6%

gab

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
3.4.1	Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	24-oct-24	18-ene-28	6%

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 30 de junio 2025	Ejecución Período Abr - Jun 2025	Ejecución %	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	3,961,004.07	1,215,251.09	8.0	44,108,995.93

JCP

JUAN CARLOS PEREZ SALIENT
Coordinador General UCP-MH

